DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME

Communauté de Communes CAUX-AUSTREBERTHE

Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service « Assainissement Collectif » Exercice 2025

Rapport établi par IC- Eau Environnement

Le retour à la source

SOMMAIRE

1 – Préambule....2
2 - Organisation....2
3 – Missions assurées par le délégataire....2
4 – Principales caractéristiques du service....3
4.1. Présentation du service....3
4.2. Évolution du volume collecté....3
4.3. Les réseaux d'assainissement et ouvrages associés....4
4.4. Les stations d'épurations....5
5 – Gestion du patrimoine et exploitation....6
5.1. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux....6
5.2. Taux moyens de renouvellement des réseaux....6
5.3. Les interventions....6
5.4. Station d'épuration....10
5.4.1 STEP de Villers-Ecalles....10
5.4.2 STEP de Blacqueville....14
5.5. Principaux faits marquants de l'année....15
6 – Tarification du service....17
6.1. Facture-type assainissement....17
6.2. Évolution de la facture globale....18
6.3. Compte annuel de résultat de l'exploitation du délégataire (CARE)....21
7 – Fonctionnement du service pour la Communauté de Communes....23
8 – Indicateurs de performance réglementaires....23
9 – Financement des investissements....24
9.1. Investissements réalisés par le délégataire....24
9.2. Fonds de renouvellement et garantie de continuité de service....24
9.2. Compte administratif....24
9.3. Financement des investissements....24
10 – Propositions d'améliorations du service....25

1 – Préambule

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la présentation au Conseil Communautaire par le Président d'un rapport annuel sur le prix et sur la qualité du service public d'assainissement (art. L-2224-5).

Ce rapport a été établi conformément aux dispositions notamment du décret 95-635 du 6 mai 1995 et de l'arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement, sur la base des données disponibles.

Ce rapport vise à rendre compte de :

- La consistance et la performance du service rendu,
- Les aspects financiers de la gestion du service,
- La conformité du service à la réglementation.

2 - Organisation

En 2022, la Communauté de Communes Caux-Austreberthe (**CCCA**) a confié par Délégation son Service Public d'Assainissement Collectif à la Société Eaux de Normandie.

Le nouveau contrat est en vigueur depuis le 05 novembre 2022 pour une durée de 10 ans. La fin du contrat est prévue au 04 novembre 2032.

Le contrat actuel intègre la gestion du réseau d'assainissement des communes de Bouville et Blacqueville depuis le 15 janvier 2023.

3 – Missions assurées par le délégataire

Les prestations assurées par le délégataire dans le cadre du service telles que décrites au sein du contrat de DSP :

- le transport, la collecte et le traitement des eaux usées,
- l'exploitation, l'entretien, la surveillance, les réparations de l'ensemble des ouvrages du service mis à disposition par la Collectivité,
- la réception et le traitement des sous-produits,
- la facturation est à réaliser par application de bordereau des prix unitaires.

La Communauté de Communes Caux Austreberthe dispose de deux systèmes d'assainissement :

- le système d'assainissement de la station de traitement de Barentin qui reçoit les effluents des communes de Barentin, Limésy, Pavilly, Sainte-Austreberthe, Villers-Écalles, Émanville, Bouville et les effluents d'autres collectivités :
  - Métropole Rouen Normandie : Hameau du Paulu et Saint Pierre de Varengeville.
  - SIAEPA de Montville : Roumare et Pissy-Pôville.
  - Ex-Syndicat de Fréville : Bouville (Blacqueville et Bouville font partie de la CCCA).
  - Syndicat de Sierville (Hameau du Catillon).

- Le système d'assainissement de la station de traitement de Blacqueville qui reçoit les effluents de la commune de Blacqueville.

4 – Principales caractéristiques du service

4.1. Présentation du service

Les principales caractéristiques du service d'assainissement sont récapitulées par le tableau ci-après.

Désignation	Données
Nombre d'habitants desservis (estimation)	29 634
Nombre d'abonnés Eau Potable*	13 571
Nombre d'usagers	11 987 *
Consommation en eau potable comptabilisée : volume vendu aux abonnés du service	962 876 m³
Volume reçu à la station d'épuration de Barentin	2 070 345 m³
Volume reçu à la station d'épuration de Blacqueville (source bilan)	10 832 m³
Linéaire de réseau d'assainissement	175, 52 km
Poste de relèvement	29 unités
Station d'épuration de type Boues activées (Barentin)	TS : 34 800 EH TP : 41 200 EH
Station d'épuration filtre plantés de roseaux (Blacqueville)	500 EH
Taux de collecte	NC
Taux de satisfaction	NC
Taux de réclamation	NC u /1000 abonnés
Taux de créances irrécouvrables	3.32 %
Taux d'impayés	0,04 %

NC : non communiqué

* 11 854 abonnés sur la STEP de Barentin et + 133 abonnés sur la STEP de Blacqueville.

4.2. Évolution du volume collecté

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des volumes mensuels collectés à l'entrée de la station d'épuration de Barentin.

Volume m³/mois	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Janvier	161 376	238 471	184 220	206 254	238 051	270 366
Février	240 789	209 023	151 084	132 675	250 949	208 472
Mars	236 300	179 099	148 819	180 601	236 500	195 977
Avril	175 762	156 089	158 488	173 638	212 620	173 783
Mai	168 600	173 745	149 490	156 263	208 763	168 902
Juin	156 951	186 629	145 834	149 151	184 339	160 397
Juillet	140 536	161 496	130 123	150 463	177 140	158 455
Août	146 304	152 600	124 997	149 721	162 493	146 057
Septembre	134 330	138 001	150 186	154 863	178 893	143 331
Octobre	178 644	160 555	131 806	155 297	176 706	154 480
Novembre	128 649	140 181	172 361	247 307	179 749	144 220
Décembre	202 913	192 033	184 142	225 430	204 471	145 905
Total m³/an	**2 071 154**	**2 087 922**	**1 831 550**	**2 081 663**	**2 410 674**	**2 070 345**

Le volume collecté en amont de la station d'épuration de Barentin en 2025 a diminué de **14,12%** par rapport à 2024.

Le volume déversé en cours de traitement (point A5) est de **18 170m³** en 2025 contre **9 541 m³** en 2024 soit une augmentation de **8 629 m³**

Le volume total traité par la station d'épuration est de : **2 171 460 m³** en 2025 contre **2 393 195 m³** en 2024 soit une diminution de **9,3 %.**

Remarque : Un écart a été constaté entre la valeur indiquée dans le tableau de bord et celle figurant dans le RAD 2025 concernant le volume d'entrée à la STEP de Barentin. Le tableau de bord fait état d'un volume de **2 185 708 m³**, tandis que le RAD mentionne un volume de **2 070 345 m³**, soit un écart de **115 363 m³/an**. Une explication est demandée au délégataire.

Pour la station de Blacqueville, le volume entrant annuel estimé est de **10 832 m³ en 2025** contre 28 293 m³ en 2024 (source bilan annuel de la STEP) soit une forte baisse de **67%**.

Le délégataire explique que cet écart est lié à la modification de la méthodologie d'estimation des volumes en 2025 : calcul du volume selon la hauteur dans la bâche avec la sonde de niveau.

Volume m³/an	2020	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
STEP Blacqueville				25 951	28 293	**10 832**	**-67%**

Les données antérieures ne sont pas disponibles.

4.3. Les réseaux d'assainissement et ouvrages associés

Le tableau ci-après récapitule le linéaire des canalisations et les différents équipements du réseau. En 2025, le linéaire total des réseaux d'assainissement est de **175 267 ml**.

Ouvrages	Quantité
Réseau gravitaire Eau Usée (séparatif)	160 093
Réseau gravitaire (unitaire)*	2 748 ml
Canalisation de refoulement Eau usée (séparatif)	12 426 ml
Canalisation de refoulement (unitaire)	0 ml
Total réseau d'assainissement Eau Usée	**175 267 ml**

** lotissement de la Vierge (réseau unitaire)*

Ouvrages	Quantité
Nombre de PR	**29**
Nombre de bouches d'égout, grilles avaloirs	**50 unités***
Nombre de regards	4 994
Nombre de branchement	991 unités**
Nombre d'ouvrage de prétraitement en réseau	1 unités***
Nombre de déversoirs d'orage	**3 unités**
Nombre de chasses d'eau	**8 (arrêtées)**

(*) lotissement de la Vierge (réseau unitaire)

(**) Le nombre de branchement indiqué ci-dessus est le nombre de branchement répertoriés au SIG mais pas le nombre de branchement réel sur le territoire.

(***) L'ouvrage de prétraitement se situe route du Chemin noir à Villers-Ecalles.

4.4. Les stations d'épurations

Station d'épuration de Barentin

La station d'épuration, boues activées de Barentin dispose d'une capacité nominale de traitement de **34 800 EH en temps sec** et de **41 200 EH en temps de pluie**. La station a été mise en service en 2010 et dotée d'une filière de traitement de type boues activée avec traitement tertiaire (décantation lamellaire).

D'après l'article 9 de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2008, la capacité de traitement de la station d'épuration est comme suit :

Paramètre	Valeur
Capacité de la station d'épuration	41 200EH
Débit de référence	11 315 m^3/j
Débit de pointe horaire	620 m^3/h
Débit moyen horaire	471 m^3/h
Flux DCO	5 922 kg/j
Flux en DBO_5	2 473 kg/j
Flux en MES	3 759 kg/j
Flux en NK	712 kg/j
Flux en P	161 kg/j

Station d'épuration de Blacqueville

La station d'épuration plantés de roseaux de Blacqueville, dispose d'une capacité nominale de traitement de 500 EH. La station a été mise en service en 2016.

D'après l'Arrêté du 22/06/2007 et du 15/07/2015, la capacité de traitement de la station d'épuration est comme suit :

Paramètre	Valeur
Capacité de la station d'épuration	450 EH
Débit de référence	54 m^3/j
Flux DCO	kg/j
Flux en DBO_5	27 kg/j
Flux en MES	kg/j
Flux en NK	kg/j
Flux en P	kg/j

5 – Gestion du patrimoine et exploitation

5.1. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux

Le tableau ci-après récapitule l'évolution de l'indice de connaissance des réseaux. Pour l'année 2025, cet indice est de **25/120**, avec une légère amélioration par rapport à l'année 2023 mais reste jugé **très insuffisant**.

Année	2022	2023	2024	2025
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement (sur 120 points)	15	15	25	25

Remarque : Le RAD 2022 indique **63 points** pour cet indice mais cette valeur comptabilise la partie C or cette partie ne peut être additionnée si la somme des parties A et B est inférieure à 40 points ce qui est le cas.

La différence des valeurs de l'indice entre 2022 à 2025 est à justifier par le délégataire.

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux pourra être nettement amélioré en établissant un inventaire des canalisations avec les différentes caractéristiques : diamètres, matériaux et années de pose.

La répartition des réseaux d'assainissement par type de matériau est donnée par le tableau ci-dessous.

Réseau	Type	Acier	Amiante Ciment	Béton	Fonte-Grès	PVC, PE, PP	Inconnu	TOTAL
Eaux Usées	Gravitaire	-	1 932	41 439	3 969	19 240	93 603	160 093
Eaux Usées	Refoulement	834	-	56	-	8 695	2 842	12 426
Unitaire	Gravitaire	-	-	-	-	-	2 748	2 748
TOTAL		**834**	**1932**	**41 404**	**3 969**	**27 935**	**99 193**	**175 267**

En 2025, le linéaire de réseau est estimé à **175 267 ml**, il a diminué d'environ **35 ml** par rapport à 2024 (**175 302** ml).

5.2. Taux moyens de renouvellement des réseaux

Aucun renouvellement de canalisations n'a été opéré par le délégataire sur la période 2008 – 2025.

5.3. Les interventions

Interventions d'urgence sur le réseau

En 2025, **39 opérations de débouchages** ont été réalisées sur le réseau dont **22** interventions sur des branchements et **17** interventions sur des canalisations (source tableau de bord du délégataire).

A noter que le RAD indique **36 opérations de débouchages** (25 sur branchements et 11 sur canalisations, le délégataire confirme les données du tableau de bord indiquées ci-dessus).

Le tableau ci-après récapitule la répartition des interventions d'urgence réalisées sur les réseaux d'assainissement par commune (source tableau de bord).

Commune	Canalisations	Branchements
BARENTIN	13	12
PAVILLY	3	2
VILLERS ECALLES		3
SAINT AUSTREBERTHE		1
LIMESY		
EMANVILLE		
Bouville	1	
Blacqueville		
Total	17	18

Astreintes

En 2025, le délégataire a réalisé **7 interventions en astreinte.**

Le nombre d'interruption de service non programmé n'a pas été renseigné.

Curage préventif des réseaux

Le tableau ci-après récapitule les linéaires curés sur la période 2022-2025 (source tableaux de bord).

Interventions curage préventifs	2022	2023	2024	2025	Total contrat actuel	N/N-1
Linéaire curage préventif (ml)	NI	7 850	3 320	1 973	13 143	-40,57%
Linéaire curage préalable au ITV (ml)	NI	6 466	3 700	1 672	11 838	-54,81%
TOTAL (ml)	11 160	14 316	7 020	3 645	36 141	-48,08%

(*) Non identifié dans le tableau de bord de 2022.

Interventions curage préventifs	2022	2023	2024	2025	Total contrat actuel	N/N-1
Linéaire curage (ml)	11 160	17 503	10 744	3 645	43 052	-66,07%

En 2025, **3 645 ml** de canalisations ont été curés en préventif (y compris les curage préalable aux ITV) soit environ **2,2%** du linéaire total des réseaux gravitaires d'assainissement (162 841 ml).

On rappelle que le **contrat actuel** prévoit le curage préventif (**hors curage préalable aux inspections ITV**) de **7,5%** du linéaire des réseaux par an, soit un linéaire d'environ **12 213 ml**. La longueur de canalisation curée en 2025 est **au-dessous de cette valeur**.

Le curage du réseau d'Émanville (rue de la Croix de Bois et centre), d'un linéaire de **1 672 ml,** a été réalisé au préalable d'une ITV. Ce linéaire devra donc être exclut du linéaire de curage préventif.

Le tableau ci-après présente les linéaires de curage préventifs indiqués dans les RAD (linéaire incluant les curage préalable aux ITV et curage curatifs).

Interventions curage préventifs	2022	2023	2024	2025	Total contrat actuel	N/N-1
Données RAD	**11 160**	**17 503**	**10 744**	**7 125**	**46 532**	**-33,68%**

Remarque : A noter que le délégataire indique dans **son bilan d'exploitation 2025** : **3 480 ml** de curage réalisé en curatif alors que le RAD affiche 7 125 ml de curage. Une mise au point concernant cet engagement contractuel devra être réalisée afin de clarifier ce point.

Remarque : Il est à noter que le délégataire indique, dans son **tableau de bord 2024**, un linéaire de curage réalisé de **7 175,53 ml**, incluant les curages préalables aux inspections télévisées (ITV), alors que le RAD mentionne un linéaire de **10 744 ml**. Une explication est demandée au délégataire afin de justifier cet écart.

Par ailleurs, le linéaire de curage préventif, hors curages préalables aux ITV, s'élève à **3 480,30 ml** selon le tableau de bord 2025, soit une valeur très inférieure à l'engagement contractuel prévu pour l'année 2025.

Depuis 2022, le délégataire a réalisé un linéaire de **46 532 ml** de curage des réseaux soit environ en moyenne **11 633 ml** par an ce qui est un légèrement en dessous du **linéaire contractuel** (linéaire 2024 et 2025 à confirmer par le délégataire).

Interventions d'inspection par caméra

Le linéaire inspecté par caméra sur la période 2022-2025 est indiqué dans le tableau ci- dessous.

ITV	2022	2023	2024	2025	Total contrat actuel	N/N-1
Longueur de canalisation inspectée par caméra (ml)	**877**	**7 302**	**3 875**	**1 942**	**13 996**	**-49,88%**

Le linéaire inspecté en 2025 est de **1 942 ml**, ce linéaire a baissé de **49,88 %** par rapport à celui inspecté en 2024. Ce linéaire représente **1,2%** du linéaire des canalisations gravitaires (162 841 ml).

On rappelle que le contrat actuel prévoit l'inspection de **5%** du linéaire des réseaux gravitaires par an, soit un linéaire d'environ **8 142 ml**.

Contrôle des branchements

En 2025, le délégataire a réalisé **255 contrôles de branchements** existants (dans le cadre de vente et hors vente) :

- 204 sont conformes.
- 50 sont non-conformes.
- 1 impossibles à diagnostiquer

Le délégataire n'a pas précisé le type de contrôle : dans le cadre de vente et hors vente, demande de complément demandé.

Réparations

En 2025, le délégataire a réalisé **26 repartions** détaillées comme suit :

- 3 sur branchements,
- 4 sur canalisations,
- 19 sur ouvrages

Opérations de maintenance préventives des ouvrages des réseaux

Le RAD mentionne la réalisation **de 58 opérations de curage** de poste de refoulement / relèvement en 2025 soit 2 curages par poste.

Opérations de maintenance curatives des ouvrages des réseaux

Le RAD mentionne la réalisation **de 12 opérations de débouchages** de pompe de poste de refoulement / relèvement en 2025. Le PR des Fuchsias à Émanville et le PR Hameau de l'enfer à Villers-Écalles semblent les plus sujet à la problématique de bouchage de pompes avec **5 et 7 opérations** de débouchage réalisé par le délégataire en 2025 respectivement.

Opérations de maintenance préventives et curatives des ouvrages de traitement

Les interventions de maintenance réalisées en préventif et en curatif sur la station d'épuration et les postes de refoulement / relevage sont indiqués dans le tableau ci-après.

Ouvrage / Équipement	Intervention	Nature
PR PAVILLY VALLEE	Renouvellement pompe 2	Non précisé
PR LOTISSEMENT VAUQUELIN À BOUVILLE	Renouvellement pompe 1	Non précisé
PR ROUTE DE DUCLAIR	Renouvellement pompe 1 et pompe 2	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement matériel informatique	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement toile Filtres presse	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement composants surpresseur N°3	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement sonde de mesure gaz	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement variateur pompe temps sec N°1	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement débitmètre alimentation FAP	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement frein levage grappin	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement débitmètre A2 Bypass amont STEP	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement Débitmètre A3 refoulement tps sec	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement débitmètre extraction boues vers table	Non précisé
STEP BARENTIN	Renouvellement Débitmètre Biolix	Non précisé

Nature de l'intervention (curative/ préventive) : non précisé par le délégataire

Renouvellements de réseaux

Le délégataire n'a pas indiqué de renouvellement « réseau » pour 2025.

Renouvellement : Postes de relèvement ou de refoulement et station d'épuration

Le Rapport Annuel du Délégataire mentionne les renouvellements réalisés sur les installations d'assainissement « postes de relèvement /refoulement et station d'épuration » ainsi que leurs coûts.

Le coût total des opérations de renouvellement et renouvellement partiel est de **43.836,35 €HT.**

Le délégataire n'a pas précisé si ces prix intègrent le coût des factures, coûts internes immobilisés et frais généraux.

Le délégataire n'a pas précisé que les opérations sont réalisées dans le cadre des renouvellements programmés ou de la garantie du fonctionnement des ouvrages.

Dans le CARE, il a été imputé la somme de 94.844 € pour le renouvellement programmé en 2025 sans aucun détail.

Le montant des opérations de renouvellement est de **43.836,35 €**. Il n'a pas été détaillé pour chaque type de renouvellement comme suit :

- Renouvellement patrimonial (renouvellement programmé)
- Renouvellement fonctionnel (renouvellement non programmé au titre de la garantie) :

Les opérations ont été listées et chiffrées dans le RAD 2025.

5.4. Station d'épuration

5.4.1 STEP de Villers-Ecalles

Évolution de la charge entrante

D'après le bilan d'exploitation 2025, les volumes entrants à la station d'épuration de Barentin s'élèvent à **2 170 345 m³**, soit (sur 365 jours) un débit moyen journalier de **5 672 m³/j**.

Cette charge hydraulique représente **50,13%** de la capacité nominale de la station d'épuration (**11 315 m³/j**).

On rappelle que la capacité de l'usine définie dans l'arrêté préfectoral est de **2 473 kg de DBO_5** par jour. En 2024, la charge moyenne entrante de DBO_5 est de **1 127 kg/j** (*source bilan d'exploitation*). Cette charge représente **49,5 %** de la capacité nominale de l'installation.

Le volumes déversé en tête de la station d'épuration est de **0 m³** en 2025 contre 1 448 m³ en 2024.

Le volume déversé en cours de traitement est de **18 170 m³** en 2025 contre 9 541 m³ en 2024.

Le volume total traité par la station d'épuration de Barentin est de **2 171 460 m³** en 2025 contre **2 393 195 m³** en 2024 soit une baisse de **9,3%.**

Données	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volume entrant (m^3/j)	**5 659**	**5 733**	**5 018**	**5 703**	**6 587**	**5 672**
Capacité hydraulique (m^3/j)	11 315	11 315	11 315	11 315	11 315	11 315
Charge DBO_5 entrante (kg/j)	**1 121**	**1 181**	**1 236**	**1 249**	**1 127**	**1 224**
Capacité épuratoire en DBO_5 (kg/j)	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473	2 473

Adéquation de la capacité à la charge entrante

Les données d'autocontrôle de la station d'épuration de Villers-Ecalles des charges entrantes de 2025 sont récapitulées par le tableau ci-après.

Paramètre	Volume (m^3/j)	DCO (kg/j)	DBO_5 (kg/j)	MES (kg/j)	NTK (kg/j)	NGL (kg/j)	Pt (kg/j)
Charge moyenne annuelle entrante	5 672	2 804	1 224	1 630	297	300	38,0
Charge maxi entrante	12 469	4 473	2 176	3 471	401	409	68,0
Capacité épuratoire	**11 315**	**5 922**	**2 473**	**3 759**	**712**	**-**	**161**
Occurrence de dépassement de capacité (%)	**1,1%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**	-	**0,0%**
Nombre de dépassement / Nombre d'analyse	5/365	0/52	0/24	0/52	0/26	-	0/26

Source : Données Bilan d'exploitation (EDN)

En 2025 : **5 dépassements** de la charge hydraulique et **0 dépassement** de la charge de pollution n'a été observé au cours des campagnes de mesure d'autosurveillance.

Rendements épuratoires

Le tableau ci-après récapitule les résultats des charges en entrée et en sortie de la station d'épuration Barentin. Les rendements d'élimination sont corrects.

Paramètres*	DCO	DBO_5	MES	NTK	NGL	Pt
Nombre de bilans disponibles	54	28	54	28	28	28
Charge moyenne entrante (kg/j)	2 804	1 224	1 630	297	300	38
Charge moyenne en sortie (kg/j)	153,6	22,5	27,6	19,1	32,8	2,9
Rendement moyen annuel (%)	**94,5%**	**98,2%**	**98,3%**	**93,6%**	**89,1%**	**92,4%**
Concentration moyenne en sortie (mg/l)	23,5	3,9	4,6	3,5	5,9	0,5
Prescription de rejet - Concentration max. (mg/l)	**50,00**	**15,00**	**20,00**	**5,00**	**10,00**	**1,00**

**Source : Données bilan d'exploitation (EDN)*

La qualité du rejet dans le milieu naturel est **très excellente**.

Quantités des sous-produits évacuées

Le tableau ci-après récapitule les quantités des sous-produits du traitement sur la période 2018-2025 de la station d'épuration Barentin.

Paramètres	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Refus de dégrillage évacués (t)	23,32	19,7	19,9	18,1	-9,05
Sables lavés évacués (t)	41,2	89,5	76,8	45,6	-40,63%

Les quantités des refus de dégrillage ont légèrement diminué de **-9,05%** par rapport à 2024.

La quantité des sables lavés évacués a diminué de **-40,63 %** en 2025 par rapport à l'année 2024.

Les sables sont évacués en valorisation industrielle (repris par « Vafro TP ») et les refus du dégrillage sont envoyés en incinération (vers le quai de transfert du « SMEDAR »).

Quantités des boues produites et évacuées

Le tableau ci-après récapitule les quantités des boues produites sur la période 2011-2025 de la station d'épuration Barentin. Les boues produites sont destinées à l'épandage agricole. En 2025, la quantité des boues brutes produites a diminué de **-1,1%** par rapport à 2024.

Paramètres	Boues Brutes (TBB/an)	Siccité (%)
2022	2 937,12	30,00%
2023	2 988,14	28,80%
2024	2 833,12	30,00%
2025	2 801,5	28,33%

La quantité de boues valorisées par épandage agricole est de **793,7 T MS** en 2025 contre **915,5 T MS en 2024** soit une diminution de **13,3 %.**

Réception de matières de vidanges

La réception des matières de vidange est réalisée via des conventions avec 5 entreprises de curage. Les quantités reçues de la station d'épuration Barentin sont récapitulées dans le tableau ci-après.

Paramètres	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Matières de vidange (m^3)	210,7	236,0	429,0	1189,0	177,16%
Graisse (T)	9,6	4,4	5,1	31,8	523,53%
Matières de curage (T)	204,6	802,0	696,4	343,7	-50,65%
Apport extérieur d'effluents industriels (m^3)				478,0	-
Balayage (T)	NC	NC	NC	NC	-

On note une forte augmentation des matières de vidange réceptionnées : de **177,16 %**,

Les graisses réceptionnées ont également fortement augmenté de **523,53%** par rapport à 2024, Les matières de curages réceptionnées ont baissé de **50,7 %** par rapport à 2024.

La quantité des produits de balayages de voiries ne figure pas dans le RAD ni dans le tableau de bord de l'année 2025.

En 2025, la STEP de Barentin a réceptionné **480 m³** d'effluents industriels (Lixiviats).

Consommations électriques des postes de relèvement ou de refoulement et de la station d'épuration

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des consommations électriques des installations de traitement.

STEP	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Consommation annuelle d'électricité (kWh) Barentin	987 253	990 733	976 586	1 052 875	7,81%
Volume traité m³	2 042 201	2 066 731	2 393 195	2 171 460	-9,27%
Consommation d'électricité (kWh/m³)	0,48	0,48	0,41	0,48	18,82%

La consommation électrique de la station d'épuration de Barentin pour 2025 a légèrement augmenté de **7,81 %** malgré la diminution des volumes traités de **9,27%.**

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des consommations électriques des postes de relèvement du système de collecte de la STEP de Barentin.

Postes	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Energie facturée (kWh)	75 795	69 103	87 831	68 203	-22,35%

La consommation électrique des postes a baissé de **22,35 %** en 2025 par rapport à 2024.

La consommation électrique totale (PR et STEP) s'élève à **1 121 078 kWh en 2025** soit un ratio de **0,46 kWh/m³ traité qui est correct.**

A noter que le RAD indique les consommations facturées, les consommations relevées consommées sont à fournir par le délégataire.

Consommations des réactifs de la station d'épuration

Les quantités de réactifs utilisées pour le traitement des effluents en 2024 de la station d'épuration Barentin est comme suit :

- Polymère File « eau » 0 kg (147,25 kg en 2018 : dernière donnée communiquée),
- Polymère File « Boues » : 5,16 tonnes (5,18 tonnes en 2024),

- Chaux : 296.6 tonnes (311,51 tonnes en 2024),
- Chlorure Ferrique : 170,905 tonnes (283,51 tonnes en 2024) détaillé comme suit :

  - Filière « Eau » : 23,02 tonnes (33,52 tonnes en 2024),
  - Filière « Boues » : 147,9 tonnes (249,98 tonnes en 2024)

5.4.2 STEP de Blacqueville

Évolution de la charge entrante

Le volume estimé en entrée de station est de **10 832 m³** contre 28 293 m³ en 2024.

Adéquation de la capacité à la charge entrante

D'après le bilan d'exploitation 2025, les volumes entrants à la station d'épuration de Blacqueville sont estimés à **10 832 m³**, soit (sur 366jours) un débit moyen journalier de **29,7 m³/j**.

Cette charge hydraulique représente **55%** de la capacité nominale de la station d'épuration (**54 m³/j**).

On rappelle que la capacité de la station définie dans l'arrêté préfectoral est de **30 kg de DBO_5** par jour. En 2025, la charge entrante de DBO_5 analysée en mars est de **6 kg/j** (*source bilan d'exploitation*). Cette charge représente **20 %** de la capacité nominale de l'installation.

Rendements épuratoires.

Le tableau ci-après récapitule les résultats des charges en entrée et en sortie de la station d'épuration de Blacqueville. Les rendements d'élimination sont corrects.

Paramètres	DCO	DBO_5	MES	NTK	NGL	Pt
Nombre de bilans disponibles	1	1	1	1	1	1
Charge moyenne entrante (kg/j)	13	6	7	2	1,8	0,2
Charge moyenne en sortie (kg/j)	1,2	0,2	0,1	0,2	0,4	0,2
Rendement moyen annuel (%)	**90,8%**	**96,7%**	**98,6%**	**90,0%**	**77,8%**	**0,0%**
Concentration moyenne en sortie (mg/l)	57,6	10,9	6,0	NC	NC	NC

Source : Données bilan d'exploitation (EDN)

La qualité du rejet dans le milieu naturel est excellente.

Quantités des sous-produits évacuées

Le tableau ci-après récapitule les quantités des sous-produits du traitement sur la période 2020-2025 de la station d'épuration de Blacqueville.

Paramètres	2020	2021	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Refus de dégrillage évacués (kg)	NC	NC	NC	400	500	115	**-77,00%**

**NC : non communiqué*

La quantité de refus de dégrillage évacués est de **115 kg en 2025** contre 500 kg en 2024 soit une baisse de **77%.** La destination des refus du dégrillage est : ordures ménagères.

Quantités des boues produites et évacuées

Aucune évacuation de boue n'a été effectué en 2025 sur la STEP de Blacqueville.

Consommations électriques des postes de relèvement ou de refoulement et de la station d'épuration de Blacqueville

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des consommations électriques des installations de traitement.

STEP - Blacqueville	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Consommation annuelle d'électricité (kWh)	NC	2 188	1 471	1 547	**5,17%**
Volume traité m^3	NC	25 951	28 293	10832,0	**-61,71%**
Consommation d'électricité (kWh/m^3)	NC	0,08	0,05	0,14	**174,69%**

La consommation électrique de la station de Blacqueville est de **1 547 kWh** pour l'année 2025.

Le tableau ci-après récapitule l'évolution des consommations électriques des postes de relèvement du système de collecte de la STEP de Blacqueville.

Postes	2022	2023	2024	2025	N/N-1
Energie facturée (kWh)	NC	22 307	24 473	19 162	**9,71%**

N.C : Non communiqué

La consommation électrique totale (PR et STEP) s'élève à **20.709 kWh en 2025.**

A noter que le RAD indique les consommations facturées, les consommations relevées consommées sont à fournir par le délégataire.

Consommations des réactifs de la station d'épuration

Aucune donnée n'a été communiquée pour la station d'épuration de Blacqueville.

5.5. Principaux faits marquants de l'année

Réseau

- Renouvellement de 45 ml de canalisation au niveau de la résidence des Mousquetaires à Barentin (source Bilan),
- Réalisation de deux branchements neufs,
- Suppression du TP PR Calleville 20 mai 2025,
- Mise à jour du Manuel d'Autosurveillance décembre 2025,
- Intégration du bassin versant en amont de la collectivité Caux Austreberthe pour le diagnostic permanent 2025,
- Suivi du monitoring des points noirs (Green Citizen),
- Recherche d'eau claire parasite sur la commune de Sainte-Austreberthe à l'aide de la Sewer Ball : les mesures confirment la présences d'eau claires parasites permanentes et météoriques : la CCCA a programmé des travaux de réhabilitation.

Station d'épuration

- Mise à jour du Manuel d'Autosurveillance décembre 2025,
- Renouvellement de l'arrêté d'autorisation de rejet,
- Renouvellement de la convention spéciale de déversement de l'UTEP Limésy,
- Renouvellement des débitmètres aux points A3, A6 et A7 en 2025,
- Mise en place de panneaux photovoltaïques,
- La sécurisation de la tête du forage pour les besoins de la station d'épuration (réhausse et capotage) a été réalisée en 2025. Une visite de la DDTM le 18/12/2025 a confirmé la bonne réalisation des travaux.

6 – Tarification du service

Une réforme des redevances des agences de l'eau est entrée en vigueur en France depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme vise à rééquilibrer les contributions des usagers et à valoriser les efforts des collectivités pour améliorer la gestion de l'eau.

A partir de 2025, certaines redevances, comme celles pour la pollution domestique et la modernisation des réseaux seront supprimées. Elles seront remplacées par trois nouvelles redevances qui reflètent mieux les usages de l'eau et les efforts de réservation à savoir :

- Redevance sur la consommation d'eau potable,
- Redevance performance eau potable,
- Redevance performance Assainissement.

6.1. Facture-type assainissement

Le tableau ci-après présente le prix du service d'assainissement relatif à un volume de **120 m³/an** pour les exercices 2025 et 2026.


De cette facture, on constate que le prix de l'assainissement s'établit à **2,0412 €TTC/m³** en 2025.


Pour l'exercice 2026, ce prix est de **2,2339 €TTC/m³** soit une augmentation de **9,44%** par rapport à 2025. Cette augmentation est due à l'augmentation de la part collectivité et de la part redevance performance assainissement.

Répartition - Facture type Base 120 m³ en €	2025	2026
Part Délégataire	131,7120	127,2940
Part Collectivité (CCCA)	87,6000	90,0000
Modernisation des réseaux de collecte (AESN)	0,0000	0,0000
Redevance Performance Assainissement	3,3600	26,4000
TVA (10%)	22,2672	24,3694
TOTAL €TTC	**244,9392**	**268,0634**

CC CAUX AUSTREBERTHE : ASSAINISSEMENT	Tarif		
	au 1er janvier 2025	au 1er janvier 2026	Evolution %
Part Délégataire : Abonnement	21,0000	20,2900	-3,38%
Part Collectivité (CCCA) : Abonnement	0,0000	0,0000	
Part Délégataire : Consommation	0,9226	0,8917	-3,35%
Part Collectivité (CCCA) : Consommation	0,7300	0,7500	2,74%
Modernisation des réseaux de collecte (AESN)	0,0000	0,0000	
Redevance Performance Assainissement	0,0280	0,2200	685,71%
Base 120 m³ €HT	222,6720	243,6940	9,44%
TVA (10%)	22,2672	24,3694	9,44%
Facture €TTC Base 120 m³	**244,9392**	**268,0634**	**9,44%**
Prix au m³ €TTC	**2,0412**	**2,2339**	**9,44%**
Nb d'abonnés	10 552	10 552	
Mode de gestion			
Collecte et Traitement	Affermage	Affermage	Affermage

Remarque : le prix de l'assainissement est identique sur l'ensemble du territoire de la **CCCA**.

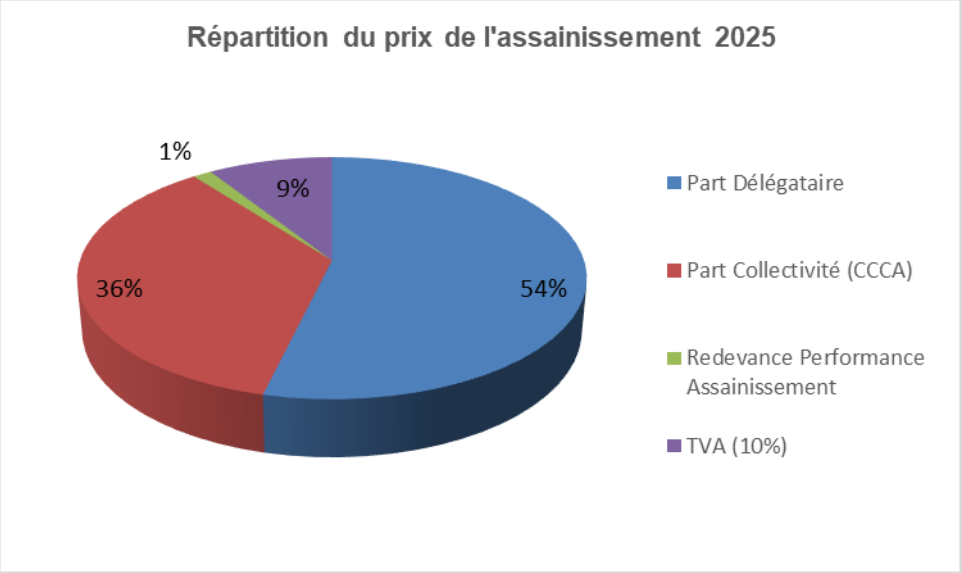

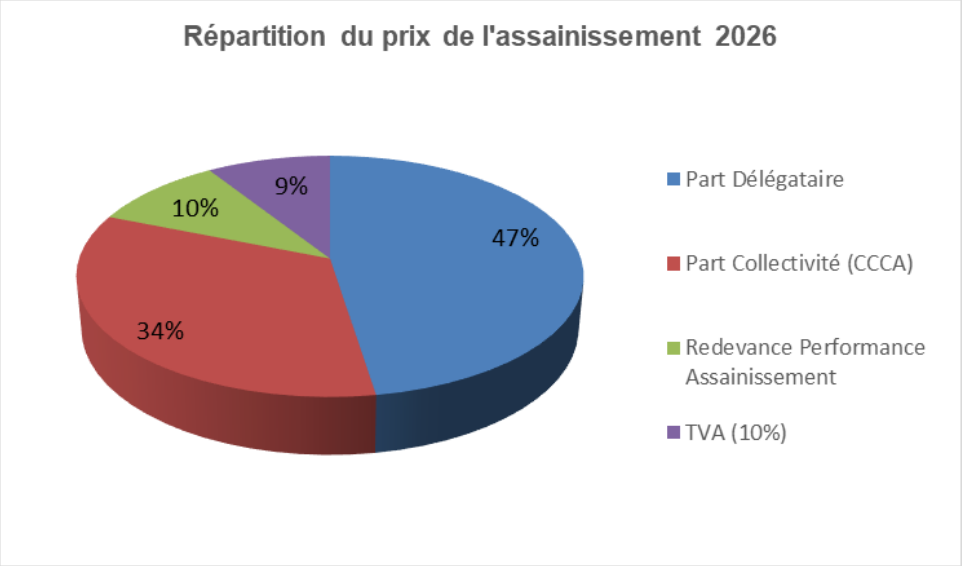

6.2. Évolution de la facture globale

Remarque : Le prix de l'eau potable n'est pas identique sur l'ensemble du territoire de la CCCA, les communes de Blacqueville et Bouville dispose d'un tarif différent de celui des autres communes de la collectivité.

- **Commune de BARENTIN, EMANVILLE, GOUPILLIERES, LIMESY, PAVILLY, SAINTE AUSTREBERTHE, VILLERS ECALLES**


Le tableau ci-après présente une facture-type globale d'eau et d'assainissement pour une consommation de **120 m³/an** pour les exercices 2025 et 2026.

Le prix global de 1 m³ d'eau s'établit à **4,7069 €TTC** au 1er janvier 2025. Ce prix a connu une hausse de **0,85%** par rapport à 2024 (**4,6674 €TTC**).

Le prix global de 1 m³ d'eau s'établit à **4,8000 €TTC** au 1er janvier 2026. Ce prix a connu une légère hausse de **1,98%** par rapport à 2025 (**4,7069 €TTC**).

Il se décompose comme suit :

	2025	2026
Eau Potable	41,30%	40,38%
Assainissement	38,83%	37,72%
Organismes Publics	12,97%	14,87%
TVA	6,89%	7,02%
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**

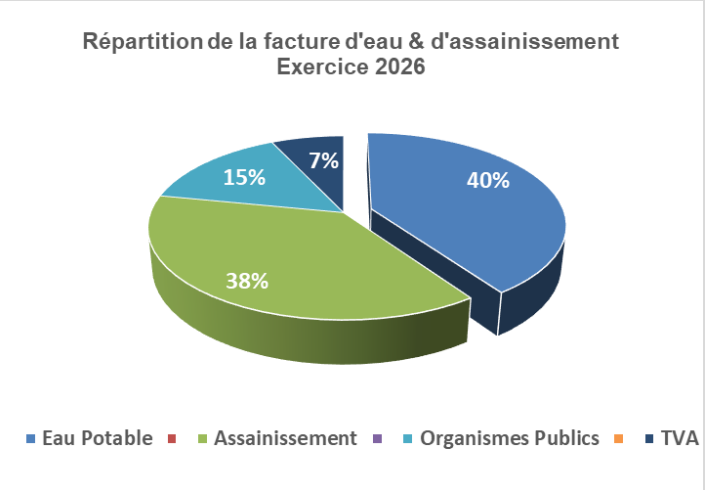

CCCA : BARENTIN, EMANVILLE, GOUPILLIERES, LIMESY, PAVILLY, SAINTE AUSTREBERTHE, VILLERS ECALLES	PU €/m³ 2026	Tarif 2025	Tarif 2026	Evolution %
Distribution de l'eau		**44,68**	**44,18**	**-1,12%**
Abonnement - délégataire		44,68	44,18	-1,12%
Abonnement - collectivité : CCCA		0,00	0,00	
Consommation		**188,60**	**188,44**	**-0,09%**
Part distributeur	1,0003	121,40	120,04	-1,13%
Part collectivité : CCCA	0,5700	67,20	68,40	1,79%
Collecte et/ou traitement des eaux usées		**219,31**	**217,29**	**-0,92%**
Abonnement - délégataire		21,00	20,29	-3,38%
Abonnement - collectivité - CCCA		0,00	0,00	
Consommation (part délégataire)	0,8917	110,71	107,00	-3,35%
Consommation (part Collectivité) : CCCA	0,7500	87,60	90,00	2,74%
Organismes publics		**112,23**	**126,09**	**12,35%**
Préservation des ressources en eau	0,0779	12,56	9,35	-25,60%
Luttre contre la pollution	0,0000	0,00	0,00	
Redevance sur la consommation d'eau potable	0,3400	55,20	40,80	-26,09%
Redevance Performance eau potable	0,0760	2,16	9,12	322,22%
Modernisation du réseau de collecte	0,0000	0,00	0,00	
Redevance Performance Assainissement	0,2200	3,36	26,40	685,71%
TVA à 5,5% - eau et TVA à 10 % - assainissement		38,94	40,42	3,80%
TOTAL en € TTC		**564,82**	**576,00**	1,98%
Prix en € TTC/m³ (base 120 m³)		**4,7069**	**4,8000**	**1,98%**


Commune de BLACQUEVILLE, BOUVILLE

Le tableau ci-après présente une facture-type globale d'eau et d'assainissement pour une consommation de **120 m³/an** pour les exercices 2025 et 2026.

Le prix global de 1 m³ d'eau s'établit à **4,3674 €TTC** au 1er janvier 2025. Ce prix a connu une hausse de **3,39%** par rapport à 2024 (**4,2240 €TTC**).

Le prix global de 1 m³ d'eau s'établit à **4,4996 €TTC** au 1er janvier 2026. Ce prix a connu une forte hausse de **3,03%** par rapport à 2025 (**4,3674 €TTC**).
Il se décompose comme suit :

	2025	2026
Eau Potable	37,61%	36,75%
Assainissement	41,51%	40,24%
Organismes Publics	13,87%	15,87%
TVA	7,01%	7,14%
TOTAL	**100,00%**	**100,00%**

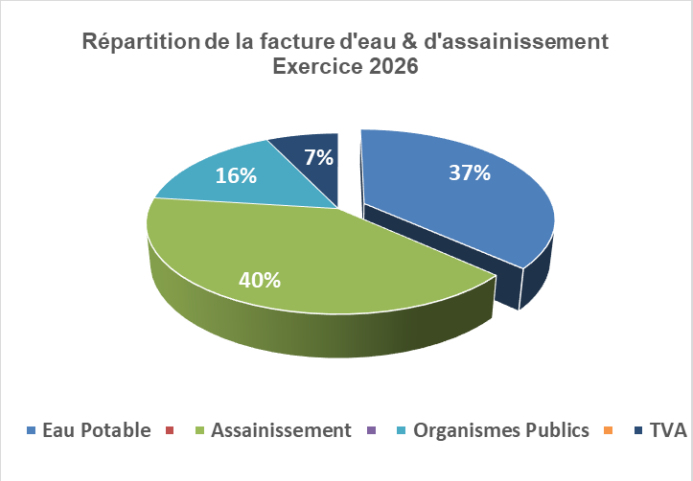

CCCA : BOUVILLE, BLACQUEVILLE	PU €/m³ 2026	Tarif 2025	Tarif 2026	Evolution %
Distribution de l'eau		**39,62**	**39,16**	**-1,16%**
Abonnement - délégataire		39,62	39,16	-1,16%
Abonnement - collectivité : CCCA		0,00	0,00	0,00%
Consommation		**159,13**	**159,29**	**0,10%**
Part distributeur	0,7574	91,93	90,89	-1,14%
Part collectivité : CCCA	0,5700	67,20	68,40	0,00%
Collecte et/ou traitement des eaux usées		**219,31**	**217,29**	**-0,92%**
Abonnement - délégataire		21,00	20,29	-3,38%
Abonnement - collectivité - CCCA		0,00	0,00	0,00%
Consommation (part délégataire)	0,8917	110,71	107,00	-3,35%
Consommation (part Collectivité) : CCCA	0,7500	87,60	90,00	2,74%
Organismes publics		**110,33**	**124,21**	**12,58%**
Préservation des ressources en eau	0,0779	12,56	9,35	-25,60%
Luttre contre la pollution	0,0000	0,00	0,00	-
Redevance sur la consommation d'eau potable	0,3400	55,20	40,80	-26,09%
Redevance Performance eau potable	0,0760	2,16	9,12	322,22%
Modernisation du réseau de collecte	0,0000	0,00	0,00	-
Redevance Performance Assainissement	0,2200	3,36	26,40	685,71%
TVA à 5,5% - eau et TVA à 10 % - assainissement		37,04	38,54	4,05%
TOTAL en € TTC		**528,39**	**539,95**	2,19%
Prix en € TTC/m³ (base 120 m³)		**4,4033**	**4,4996**	**2,19%**

6.3. Compte annuel de résultat de l'exploitation du délégataire (CARE)

Le compte annuel et l'état détaillé des produits figurent ci-après.

Ce rapport a été établi conformément aux dispositions du décret 2005-236 du 14 mars 2005, codifié à l'article R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Remarques : Il est à noter que le contrat de DSP antérieur a pris fin le 4 novembre 2022. Un nouveau contrat de DSP a pris effet à partir du 5 novembre 2022 pour une durée de 10 ans avec une intégration différée des systèmes d'assainissement des communes de Blacqueville et de Bouville.

Le tableau ci-après présente les années 2024 et 2025.

L'examen du CARE est réalisé après neutralisation des produits et charges de la collecte des redevances des organismes publics (**solde de fin de contrat**).

Plusieurs éléments sont à mettre en avant :

- Les produits ont fortement augmenté de **32,19%** en 2025,

- Les recettes liées aux collectivités et autres organismes publics enregistrent une hausse de **34,10%**.
- Les recettes liées à l'exploitation du service enregistrent une hausse de **36,16%,**
- Une baisse des recettes liées aux travaux attribués à titre exclusif de **-36,98%** (80 378 € en 2024 contre 50 658 € en 2025) sans aucune explication du délégataire.

- Les charges ont augmenté de **16,24 %** qui sont liées à la hausse les coûts suivants :

  - Produits de traitement : le coût de ce poste a baissé de **12,18%,**
  - Personnel : le coût de ce poste a augmenté de **16,82%**
  - Sous-traitance, matières et fournitures : le coût de ce poste a augmenté de **3,29%**
  - Assurances : le coût de ce poste a fortement augmenté de **156,43%**
  - Informatique : le coût de ce poste a légèrement augmenté de **23,02%,**
  - Télécommunication : le coût de ce poste a augmenté de **4,81%,**
  - Engin et véhicule, le coût de ce poste a fortement augmenté de **45,10%,**
  - Locaux : le coût de ce poste a légèrement augmenté de **6,37%,**
  - Impôts locaux et taxes : le coût de ce poste a fortement augmenté de **69,31%**, (32.907 € en 2024 contre 55 714 € en 2025)

- D'autre charges ont baissé :
  - Energie électrique : le coût de ce poste a diminué de **21,42%,**
  - Analyse : le coût de ce poste a fortement baissé de **-56,40%,**

- Les charges relatives au renouvellement ont évolué avec :
  - Une augmentation de **79,19%** de garantie pour la continuité de service,
  - Une baisse de **3,30%** de fond de renouvellement.

- Les charges relatives aux contributions des services centraux et recherche ont augmenté de **31,37%,**
- On note aussi les investissements contractuels ont augmenté de **2,10%** (**22 392**€ en 2024 contre 22 862 € en 2025) ;
- Les investissements du domaine privé ont augmenté de **24,59%.**

- **Résultats avant impôts positif sur l'année 2025 : 256.959€.**
- **Résultats après impôts positif également sur l'année 2025 : 154.970 €.**

LIBELLE		2024	2025	Ecart
PRODUITS		**1 697 665**	**2 244 060**	**32,19%**
Exploitation du service		1 106 642	1 506 759	36,16%
Collectivités et autres organismes publics		509 378	683 061	34,10%
Travaux attribués à titre exclusif		80 378	50 658	-36,98%
Produits accessoires		1 267	3 582	182,72%
CHARGES		**1 709 522**	**1 987 101**	**16,24%**
Personnel		246 729	288 231	16,82%
Energie électrique		175 112	137 596	-21,42%
Achats de prestations assainissement		0	0	
Produits de traitement		135 047	151 500	12,18%
Analyses		20 917	9 119	-56,40%
Sous-traitance, matières et fournitures		291 168	300 745	3,29%
Impôts locaux et taxes		32 907	55 714	69,31%
Autres dépenses d'exploitation		99 653	82 221	-17,49%
	Télécommunication, poste et télégestion	*7 215*	*7 562*	*4,81%*
	Engins et véhicules	*26 441*	*38 366*	*45,10%*
	Informatique	*34 081*	*41 926*	*23,02%*
	Assurances	*3 369*	*8 639*	*156,43%*
	Locaux	*13 609*	*14 476*	*6,37%*
Frais de contrôle		39600	35207	-11,09%
Ristournes et redevances contractuelles		0	0	
Contribution des services centraux et recherche		39 213	51 513	31,37%
Collectivités et autres organismes publics		509 378	683 061	34,10%
Charges relatives aux renouvellements	*Pour garantie de continuité du service*	10 123	18 139	79,19%
	Fonds contractuel (Renouvellements)	98 083	94 844	-3,30%
Charges relatives aux investissements	*Programme contractuel (investissements)*	22 392	22 862	2,10%
Charges relatives aux investissements du domaine privé		2 891	3 602	24,59%
Pertes sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement		-11 446	52 862	-561,84%
Rémunération du besoin en fonds de roulement		-2 245	-115	-94,88%
RESULTAT AVANT IMPOT		-11 857	256 959	**-2267,15%**
Apurements des déficits antérieurs		0	50 332	
Impots sur les sociétés (calcul normatif)		0	51 657	
RESULTAT		-11 857	154 970	**-1406,99%**

7 – Fonctionnement du service pour la Communauté de Communes

Le fonctionnement du service de la Communauté de Communes Caux Austreberthe (CCCA) en 2025 est caractérisé par :

- Recettes de fonctionnement : 1.207.296,33 € (1 000 821,96 € en 2024),
- Dépenses de fonctionnement : 702.921,85 € (756.464,02 € en 2024)

L'épargne brute de l'exercice 2025 est de **504.374,48€.**

8 – Indicateurs de performance réglementaires

Le tableau ci-après récapitule les indicateurs de performance du service d'assainissement collectif.

Indicateurs réglementaires (Arrêté du 2 mai 2007 – annexe II)	Données 2022	Données 2023	Données 2024	Données 2025
Nombre d'habitants desservis total	23 402	Non précisé	Non précisé	29 959
Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers (u/1000 habitants)	Non précisé	Non précisé	Non précisé	0
Taux de réclamations (u/1000 abonnés)	1,63	1,44	0,28	0,33
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	3,30%	Non précisé	0,03%	0,04%
Abandons de créance et versements à un fonds de solidarité	0 ,0 €	0 ,0 €	0 ,0 €	0 ,0 €
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement	15/120	15/120	25/120	25/120
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	Non précisé	Non précisé	Non précisé	Non précisé
Taux des boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon les filières conformes	100%	100%	100%	100%
Quantité des boues issues des ouvrages d'épuration (Boues brutes)	904,02 t	863,13	915,53	793,68
Taux de respect du délai d'ouverture maximal	Non précisé	Non précisé	Non précisé	Non précisé

Le nombre d'habitants est répartie comme ci-après : **29 634 habitants** sur la STEP de Barentin (source bilan d'exploitation) et **325 habitants** pour la STEP de Blacqueville (source CCCA).

9 – Financement des investissements

9.1. Investissements réalisés par le délégataire

Le détail des investissements n'est pas illustré dans le RAD 2025.

Le montant des investissements dans le cadre du programme contractuel indiqué dans le CARE est de **22.862,00 €** en 2025 (22.392,00 € en 2024).

9.2. Fonds de renouvellement et garantie de continuité de service

Le fonds de renouvellement est prévu dans le contrat du Délégataire. Toutefois, le montant de la garantie de continuité de service s'élève à **18.139,00 €** indiqué dans le CARE 2025 (10.123,00 € en 2024) pour une dépense imputée sur l'exercice 2025 dont le montant n'a pas été identifié. Il est demandé au délégataire de fournir le détail de ces travaux.

Pour le renouvellement patrimonial, la dotation annuelle est **98.844,00 €** indiqué dans le CARE 2025 pour une dépense de **43.836,35 €HT** imputée sur l'exercice 2025 avec le détail fourni par le délégataire.

9.2. Compte administratif

Le montant des dépenses d'investissements réalisés en 2025 par la Communauté de Communes Caux Austreberthe est de **918.793,28 €** (1.420.669,12€ en 2024)

Le montant des recettes d'investissement s'élève à **1.168.649,67 €** (1.547.869,30€ en 2024).

9.3. Financement des investissements

- Amortissement : 601.077,18 € en 2025 (602.090,19 € en 2024),
- Charges d'intérêts : 27.337,23 € en 2025 (33.002,31 € en 2024),
- Remboursement du capital : 425.007,64 € au 31 décembre 2025 (406.408,91 € au 31 décembre 2024),

Le capital restant, au 31 décembre 2025, est de **1.998.176,18 €.**

La durée d'extinction de la dette est de **3,96 ans** (sur la base d'une épargne brute de 504.374,48 € en 2025). Il s'agit d'un niveau **très correct.**

10 – Propositions d'améliorations du service

Dans les précédents RAD, l'exploitant expose quelques perspectives d'amélioration au niveau de la station d'épuration de Villers-Ecalles, listées ci-après :

- Changement des pompes d'alimentation du filtre presse par une seule pompe à piston,
- Installation de débitmètres sur l'injection de $FeCl_3$ et de lait de chaux pour le traitement des boues,
- Modification du poste de préparation polymère pour limiter les manutentions,
- Mettre en place un cycle automatique de remplissage de la trémie à boue,
- Renforcement et remplacement du filtre-presse,
- Vidange de la trémie à boue : impossibilité de fonctionner en automatique, les boues se voutent dans la trémie qui ne se vide pas et il est impossible d'entrer dans le local de stockage (présence importante d'ammoniaque) ;
- Mise en place d'un bac de réception des matières de curage,

Dans le bilan d'exploitation 2025, le délégataire expose quelques perspectives d'amélioration et des points sensibles à résoudre :

Réseau :

- Mise à jour de l'Analyse des Risque de Défaillance (ARD),
- Poursuite de la recherche d'Eaux Claires Parasites Permanents (ECPP),
- Campagne d'analyse H2S.
- L'exploitant recommande aussi de poursuivre le programme de renouvellement patrimonial et structurel.

STEP de Villers-Ecalles :

- Mise à jour de l'Analyse des Risque de Défaillance (ARD),
- Réglage du procédé pure-control : apprentissage des variables par l'IA,
- Traitement de l'azote en période hivernale : renforcement des analyses en décembre 2025-janvier et février 2026.
